



Gayrimenkul Sertifikası

Damla Kent Projesi

Proje Adı: Damla Kent
Proje Geliştiricisi: Emlak Konut GYO
Garantör ve Arsa Sahibi: TOKİ
Sertifika Kodu: DMLKT.G



Proje Hava Görşeli



Proje İlerlemesi

Ana İş Grubu	16.07.2026 İlerlemesi
Üstyapı İnşaatları	%16,04
Altyapı ve Çevre Düzenleme	%3,40
Resmi ve İdari İşlemler	%55,0
Proje Geneli Kümülatif İlerleme	%19,15

Güncel Asli Edim Durumu

Toplam Daire	Gerçekleşen Asli Edim	Kalan Daire
2.214 Adet	433 Adet*	1.781 Adet

*Asli Edimi gerçekleştiren detaylı daire listesi Ekte yer almaktadır.

Etaplara Göre Gerçekleşen Asli Edim

A Etapı	B Etapı
314 Adet	119 Adet

Daire Türlerine Göre Gerçekleşen Asli Edim

1+1	2+1	3+1	4+1
142 Adet	213 Adet	64 Adet	14 Adet

Proje Takvimi

14.08 2025 Borsada İşlem Görme Başlangıcı	06.11 2025 Proje İnşaat Başlangıcı	26.11 2025 Asli Edim Kullanım Süresi Başlangıcı	11.08 2028 Asli Edim Kullanım Süresi Bitişi	09.02 2029 Proje İnşaat Bitişi (Tahmini)
10.07 2029 Edim Değişikliği Talep Edilebilecek Son Tarih	03.08 2029 Borsada Son İşlem Görme	07.08 2029 Tali Edim İfa Süresi Bitişi	10.08 2029 Asli Edim İfa Süresi Bitişi	15.08 2029 Vade Tarihi (Tali Edim İfa Tarihi)

Proje Görselleri




Damla Kent Projesi'nin A ve B etapları, projenin ana ulaşım akslarına en yakın ve ticari hareketliliğin yoğunlaştığı öncelikli fazlar olarak kurgulanmıştır. Yatay mimari prensibiyle zemin üzerine 6 kat olarak tasarlanan bu etaplar, hem geniş peyzaj alanlarına hem de projenin sunduğu eğitim ve sosyal tesis imkanlarına doğrudan erişim avantajı sağlamaktadır.

Aile odaklı 2+1 ve 3+1 daire tipolojilerinin ağırlıkta olduğu bu bölümler, modern altyapı donatıları ve çevreci sistemleriyle projenin sürdürülebilir yaşam standartlarını ilk aşamada hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Etap Daire Dağılımı

2.214
Bağımsız
Bölüm

521
Bin m²
İnşaat Alanı

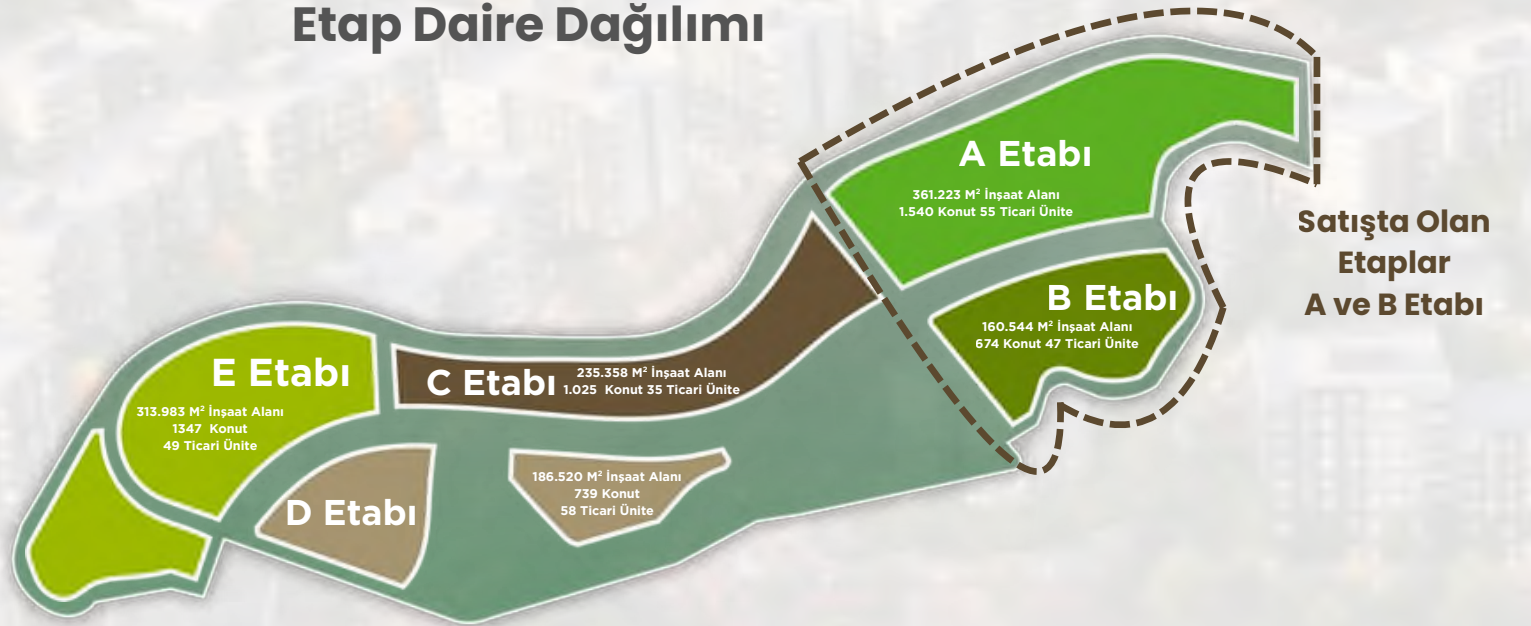

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
1	A ETAP C6	3. KAT	20	914.763
2	B ETAP A4	2. KAT	10	1.119.358
3	A ETAP A18	3. KAT	15	1.098.806
4	B ETAP A4	3. KAT	14	1.130.125
5	A ETAP C12	5. KAT	34	711.312
6	B ETAP A8	1. KAT	8	1.206.474
7	B ETAP A8	ZEMİN KAT	4	1.340.134
8	B ETAP A11	1. KAT	5	1.228.236
9	B ETAP E3	5. KAT	13	1.986.012
10	B ETAP E3	5. KAT	14	2.039.877
11	B ETAP F5	2. KAT	7	1.566.157
12	A ETAP C15	2. KAT	15	933.418
13	A ETAP C18	ZEMİN KAT	4	717.390
14	A ETAP C3	3. KAT	21	892.559
15	B ETAP A11	4. KAT	20	1.107.265
16	B ETAP A3	4. KAT	19	1.132.668
17	A ETAP C5	3. KAT	21	914.903
18	A ETAP C8	5. KAT	36	951.586
19	A ETAP C10	2. KAT	14	901.253
20	A ETAP C18	4. KAT	25	742.893
21	A ETAP D2	4. KAT	19	1.483.678
22	B ETAP A5	4. KAT	21	1.122.087
23	B ETAP A5	5. KAT	25	1.128.465
24	B ETAP A7	6. KAT	25	1.484.321
25	A ETAP A3	6. KAT	27	1.130.197
26	A ETAP F3	2. KAT	9	1.573.799
27	B ETAP A4	6. KAT	26	1.158.120
28	A ETAP B2	3. KAT	32	1.256.526
29	A ETAP C17	4. KAT	25	742.893
30	A ETAP C15	3. KAT	21	942.615
31	A ETAP C1	2. KAT	14	894.627
32	A ETAP A1	3. KAT	17	1.100.452
33	A ETAP C14	3. KAT	23	907.131
34	A ETAP C5	4. KAT	26	924.228
35	B ETAP C5	4. KAT	30	981.236
36	B ETAP F5	2. KAT	8	1.576.278
37	B ETAP C3	ZEMİN KAT	4	773.113
38	A ETAP C14	2. KAT	16	924.894
39	A ETAP C14	3. KAT	22	934.006
40	A ETAP F5	1. KAT	7	1.556.036
41	A ETAP F5	ZEMİN KAT	5	1.540.267
42	A ETAP A2	4. KAT	17	1.097.992
43	B ETAP A8	5. KAT	22	1.149.150
44	B ETAP C4	ZEMİN KAT	4	779.662
45	B ETAP F2	2. KAT	8	1.565.145
46	A ETAP C12	ZEMİN KAT	4	682.500
47	A ETAP C8	4. KAT	30	946.218
48	B ETAP C4	4. KAT	29	952.249
49	B ETAP A4	4. KAT	18	1.140.175
50	A ETAP A7	4. KAT	19	1.116.020

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
51	A ETAP C10	6. KAT	37	709.300
52	A ETAP C18	1. KAT	7	722.312
53	B ETAP F1	2. KAT	8	1.609.364
54	B ETAP F2	2. KAT	7	1.566.157
55	A ETAP C11	4. KAT	28	710.052
56	A ETAP C15	1. KAT	7	708.889
57	B ETAP C3	4. KAT	29	950.464
58	A ETAP C15	2. KAT	13	716.495
59	B ETAP A2	6. KAT	26	1.176.190
60	B ETAP A5	4. KAT	24	1.470.247
61	B ETAP C3	5. KAT	35	955.819
62	B ETAP F1	3. KAT	10	1.624.543
63	A ETAP A2	3. KAT	13	1.088.071
64	A ETAP C1	2. KAT	15	899.372
65	A ETAP C6	5. KAT	35	1.480.193
66	A ETAP C7	1. KAT	10	693.850
67	B ETAP A11	ZEMİN KAT	1	1.361.398
68	A ETAP C11	ZEMİN KAT	4	763.950
69	A ETAP C3	1. KAT	9	876.460
70	A ETAP C12	2. KAT	16	694.723
71	A ETAP A3	4. KAT	20	1.127.910
72	A ETAP C11	3. KAT	22	703.917
73	A ETAP C12	3. KAT	22	701.271
74	A ETAP C5	2. KAT	15	906.035
75	A ETAP C7	5. KAT	34	717.860
76	B ETAP A8	4. KAT	20	1.460.707
77	B ETAP F1	3. KAT	9	1.581.030
78	B ETAP A4	5. KAT	22	1.146.635
79	A ETAP C5	1. KAT	8	899.525
80	A ETAP C7	3. KAT	22	707.820
81	A ETAP C9	ZEMİN KAT	1	753.069
82	A ETAP C12	4. KAT	28	707.383
83	A ETAP D1	5. KAT	23	1.979.587
84	A ETAP E2	3. KAT	12	2.000.027
85	A ETAP A2	2. KAT	9	1.077.441
86	B ETAP A2	3. KAT	14	1.137.542
87	B ETAP C3	3. KAT	23	942.134
88	B ETAP A3	3. KAT	15	1.122.779
89	B ETAP C1	ZEMİN KAT	4	704.814
90	A ETAP C11	2. KAT	16	697.344
91	A ETAP C14	3. KAT	20	716.604
92	A ETAP C8	6. KAT	40	735.937
93	A ETAP D1	3. KAT	13	1.448.867
94	B ETAP E3	2. KAT	7	1.938.410
95	B ETAP C2	1. KAT	16	869.271
96	B ETAP E1	5. KAT	14	2.039.877
97	A ETAP C14	2. KAT	14	709.954
98	A ETAP C17	3. KAT	19	736.629
99	B ETAP A6	3. KAT	16	1.126.339
100	A ETAP C7	2. KAT	16	701.271

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
101	A ETAP F2	1. KAT	8	1.576.291
102	A ETAP C17	2. KAT	13	729.918
103	A ETAP C5	5. KAT	31	708.009
104	A ETAP C12	1. KAT	10	687.302
105	A ETAP C14	2. KAT	17	898.309
106	B ETAP C3	3. KAT	24	969.871
107	B ETAP C5	3. KAT	23	967.719
108	A ETAP C6	5. KAT	36	1.506.440
109	B ETAP A8	3. KAT	16	1.447.483
110	A ETAP C15	3. KAT	19	723.206
111	A ETAP C2	1. KAT	7	674.116
112	A ETAP C5	2. KAT	16	880.086
113	A ETAP C7	4. KAT	28	713.931
114	A ETAP C9	2. KAT	15	929.685
115	A ETAP C7	4. KAT	31	915.692
116	B ETAP A3	3. KAT	14	1.441.848
117	A ETAP C2	3. KAT	19	686.113
118	B ETAP C1	4. KAT	25	729.964
119	A ETAP C5	3. KAT	19	693.335
120	A ETAP C16	3. KAT	19	723.206
121	A ETAP C5	2. KAT	13	686.860
122	B ETAP A7	3. KAT	13	1.433.314
123	B ETAP C5	2. KAT	17	958.794
124	A ETAP C1	4. KAT	28	887.242
125	A ETAP B3	3. KAT	28	1.224.796
126	A ETAP C6	4. KAT	28	895.449
127	B ETAP C1	1. KAT	7	709.667
128	A ETAP C1	1. KAT	9	891.742
129	A ETAP C1	2. KAT	16	870.763
130	A ETAP C1	3. KAT	22	879.287
131	A ETAP C14	1. KAT	8	702.418
132	A ETAP C5	1. KAT	7	681.250
133	A ETAP C1	1. KAT	10	863.376
134	A ETAP C4	1. KAT	7	681.250
135	A ETAP C5	4. KAT	25	699.377
136	A ETAP D1	ZEMİN KAT	3	2.051.536
137	B ETAP A2	1. KAT	5	1.323.068
138	A ETAP C9	1. KAT	8	894.820
139	B ETAP A7	4. KAT	20	1.107.758
140	B ETAP C3	2. KAT	17	933.209
141	B ETAP A7	3. KAT	16	1.097.806
142	B ETAP C1	2. KAT	13	717.168
143	B ETAP C1	3. KAT	19	723.786
144	B ETAP A2	4. KAT	18	1.147.562
145	B ETAP A2	5. KAT	22	1.161.876
146	B ETAP C1	3. KAT	22	916.809
147	A ETAP A2	2. KAT	12	1.406.217
148	A ETAP D1	4. KAT	19	1.954.456
149	B ETAP C1	3. KAT	21	947.084
150	A ETAP C11	1. KAT	10	689.895

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
201	A ETAP C6	1. KAT	7	680.418
202	B ETAP A8	3. KAT	13	1.108.469
203	A ETAP A3	5. KAT	24	1.142.147
204	A ETAP C1	4. KAT	27	916.392
205	A ETAP C18	3. KAT	21	954.878
206	B ETAP C2	2. KAT	20	914.601
207	A ETAP C9	1. KAT	7	674.775
208	B ETAP C5	3. KAT	22	716.222
209	B ETAP E6	6. KAT	15	2.009.219
210	B ETAP C5	1. KAT	10	702.250
211	A ETAP C1	4. KAT	25	692.111
212	B ETAP C2	3. KAT	25	700.769
213	B ETAP C4	1. KAT	10	702.250
214	B ETAP A11	5. KAT	24	1.121.503
215	A ETAP C10	2. KAT	13	679.556
216	B ETAP A4	4. KAT	21	1.473.061
217	B ETAP B1	1. KAT	18	675.075
218	B ETAP C2	1. KAT	13	687.099
219	A ETAP A2	2. KAT	10	1.072.834
220	A ETAP C18	1. BODRUM	1	806.794
221	B ETAP A8	4. KAT	17	1.118.420
222	B ETAP A8	4. KAT	18	1.134.992
223	A ETAP C10	1. KAT	7	673.952
224	B ETAP C5	4. KAT	28	722.335
225	A ETAP A3	4. KAT	19	1.101.843
226	B ETAP C2	2. KAT	19	694.361
227	A ETAP C9	3. KAT	20	911.289
228	A ETAP A3	2. KAT	12	1.107.265
229	A ETAP A2	4. KAT	18	1.093.297
230	B ETAP C2	3. KAT	27	916.541
231	B ETAP F4	2. KAT	7	1.566.157
232	A ETAP D1	1. KAT	8	1.341.188
233	B ETAP A4	5. KAT	25	1.481.645
234	B ETAP C3	3. KAT	22	709.673
235	A ETAP A7	5. KAT	23	1.130.197
236	A ETAP B2	1. KAT	20	662.652
237	A ETAP B2	1. KAT	22	663.592
238	B ETAP B1	3. KAT	33	720.291
239	A ETAP A9	ZEMİN KAT	5	1.245.246
240	A ETAP A2	3. KAT	14	1.083.418
241	B ETAP C2	4. KAT	31	706.750
242	B ETAP C3	2. KAT	18	960.899
243	B ETAP F3	2. KAT	7	1.579.314
244	A ETAP C3	5. KAT	31	937.126
245	A ETAP B3	1. KAT	19	653.675
246	A ETAP C4	ZEMİN KAT	1	759.217
247	B ETAP A1	6. KAT	26	1.131.957
248	B ETAP B1	1. KAT	16	674.214
249	B ETAP C2	3. KAT	28	887.400
250	A ETAP A11	ZEMİN KAT	3	1.200.392

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
251	A ETAP A3	6. KAT	28	1.156.385
252	A ETAP B2	4. KAT	45	709.262
253	A ETAP C14	4. KAT	26	722.811
254	A ETAP C14	4. KAT	27	955.633
255	A ETAP C14	4. KAT	28	942.512
256	A ETAP C14	4. KAT	29	915.365
257	B ETAP E4	4. KAT	11	1.991.022
258	A ETAP C3	2. KAT	15	883.935
259	A ETAP C3	ZEMİN KAT	1	814.489
260	A ETAP C9	2. KAT	13	680.386
261	A ETAP A3	5. KAT	23	1.116.020
262	A ETAP A7	5. KAT	24	1.110.112
263	A ETAP E3	3. KAT	11	1.977.788
264	A ETAP F3	1. KAT	7	1.556.036
265	A ETAP A11	3. KAT	17	1.095.315
266	A ETAP C10	3. KAT	20	910.064
267	A ETAP C3	5. KAT	32	942.038
268	B ETAP A6	5. KAT	23	1.110.232
269	B ETAP F5	3. KAT	10	1.591.460
270	A ETAP C9	3. KAT	19	686.860
271	B ETAP C2	4. KAT	35	1.458.299
272	B ETAP C3	4. KAT	28	715.785
273	A ETAP A1	5. KAT	25	1.116.829
274	A ETAP A1	5. KAT	26	1.114.431
275	A ETAP A13	4. KAT	20	1.114.530
276	A ETAP A3	3. KAT	15	1.091.919
277	A ETAP A3	3. KAT	16	1.117.943
278	A ETAP C18	2. KAT	15	945.681
279	A ETAP C5	3. KAT	22	888.673
280	A ETAP C6	2. KAT	13	686.022
281	A ETAP C8	5. KAT	34	728.971
282	B ETAP A6	5. KAT	24	1.150.433
283	B ETAP A8	2. KAT	10	1.114.464
284	B ETAP E6	6. KAT	16	2.063.170
285	A ETAP A10	1. KAT	3	1.200.977
286	A ETAP A10	1. KAT	4	1.214.595
287	A ETAP A10	1. KAT	5	1.065.030
288	A ETAP A10	1. KAT	6	1.106.199
289	A ETAP A10	2. KAT	10	1.114.838
290	A ETAP A10	2. KAT	7	1.420.188
291	A ETAP A10	2. KAT	8	1.407.648
292	A ETAP A10	2. KAT	9	1.074.338
293	A ETAP A10	3. KAT	11	1.434.520
294	A ETAP A10	3. KAT	12	1.422.047
295	A ETAP A10	3. KAT	13	1.085.079
296	A ETAP A10	3. KAT	14	1.125.624
297	A ETAP A10	4. KAT	15	1.447.896
298	A ETAP A10	4. KAT	16	1.435.486
299	A ETAP A10	4. KAT	17	1.095.103
300	A ETAP A10	4. KAT	18	1.135.691

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
301	A ETAP A10	5. KAT	19	1.467.005
302	A ETAP A10	5. KAT	20	1.454.685
303	A ETAP A10	5. KAT	21	1.109.424
304	A ETAP A10	5. KAT	22	1.150.072
305	A ETAP A10	6. KAT	23	1.486.114
306	A ETAP A10	6. KAT	24	1.473.883
307	A ETAP A10	6. KAT	25	1.123.745
308	A ETAP A10	6. KAT	26	1.164.454
309	A ETAP A10	ZEMİN KAT	1	1.345.691
310	A ETAP A10	ZEMİN KAT	2	1.225.383
311	A ETAP B1	1. KAT	10	1.153.433
312	A ETAP B1	1. KAT	11	1.145.285
313	A ETAP B1	1. KAT	12	1.153.433
314	A ETAP B1	1. KAT	13	1.152.545
315	A ETAP B1	1. KAT	15	661.741
316	A ETAP B1	1. KAT	9	1.152.545
317	A ETAP B1	2. KAT	17	1.162.053
318	A ETAP B1	2. KAT	18	1.163.446
319	A ETAP B1	2. KAT	19	1.155.228
320	A ETAP B1	2. KAT	20	1.163.446
321	A ETAP B1	2. KAT	21	1.162.551
322	A ETAP B1	2. KAT	22	883.785
323	A ETAP B1	2. KAT	24	884.997
324	A ETAP B1	3. KAT	25	1.173.594
325	A ETAP B1	3. KAT	26	1.175.001
326	A ETAP B1	3. KAT	27	1.166.700
327	A ETAP B1	3. KAT	29	1.174.096
328	A ETAP B1	3. KAT	30	892.436
329	A ETAP B1	3. KAT	31	673.517
330	A ETAP B1	3. KAT	32	893.660
331	A ETAP B1	4. KAT	33	1.184.365
332	A ETAP B1	4. KAT	34	1.185.785
333	A ETAP B1	4. KAT	35	1.177.408
334	A ETAP B1	4. KAT	36	1.185.785
335	A ETAP B1	4. KAT	37	1.184.872
336	A ETAP B1	4. KAT	38	900.511
337	A ETAP B1	4. KAT	39	679.405
338	A ETAP B1	4. KAT	40	901.745
339	A ETAP B1	ZEMİN KAT	1	1.316.207
340	A ETAP B1	ZEMİN KAT	2	1.573.681
341	A ETAP B1	ZEMİN KAT	3	1.658.621
342	A ETAP B1	ZEMİN KAT	4	1.574.844
343	A ETAP B1	ZEMİN KAT	5	1.316.174
344	A ETAP B1	ZEMİN KAT	6	735.237
345	A ETAP B1	ZEMİN KAT	7	745.360
346	A ETAP B1	ZEMİN KAT	8	736.170
347	A ETAP C1	1. KAT	7	674.116
348	A ETAP C1	2. KAT	13	679.686
349	A ETAP C1	3. KAT	19	686.113
350	A ETAP C2	1. KAT	10	863.276

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
351	A ETAP C2	1. KAT	11	1.398.042
352	A ETAP C2	1. KAT	12	1.155.267
353	A ETAP C2	1. KAT	8	892.775
354	A ETAP C2	1. KAT	9	915.116
355	A ETAP C2	2. KAT	14	900.364
356	A ETAP C2	2. KAT	15	922.744
357	A ETAP C2	2. KAT	16	870.662
358	A ETAP C2	2. KAT	17	1.410.377
359	A ETAP C2	2. KAT	18	1.408.125
360	A ETAP C2	3. KAT	20	909.120
361	A ETAP C2	3. KAT	22	879.185
362	A ETAP C2	3. KAT	23	1.424.610
363	A ETAP C2	3. KAT	24	1.422.335
364	A ETAP C2	4. KAT	25	692.111
365	A ETAP C2	4. KAT	26	917.292
366	A ETAP C2	4. KAT	27	939.763
367	A ETAP C2	4. KAT	28	887.139
368	A ETAP C2	4. KAT	29	1.437.893
369	A ETAP C2	4. KAT	30	1.435.597
370	A ETAP C2	5. KAT	31	700.680
371	A ETAP C2	5. KAT	32	928.967
372	A ETAP C2	5. KAT	33	951.500
373	A ETAP C2	5. KAT	34	898.502
374	A ETAP C2	5. KAT	35	1.456.871
375	A ETAP C2	5. KAT	36	1.454.544
376	A ETAP C2	ZEMİN KAT	1	752.402
377	A ETAP C2	ZEMİN KAT	2	1.035.798
378	A ETAP C2	ZEMİN KAT	3	1.215.949
379	A ETAP C2	ZEMİN KAT	4	1.147.601
380	A ETAP C2	ZEMİN KAT	5	1.766.662
381	A ETAP C2	ZEMİN KAT	6	1.299.062
382	A ETAP C8	1. BODRUM	1	1.040.500
383	A ETAP C8	1. BODRUM	2	991.173
384	A ETAP C8	1. BODRUM	3	1.586.829
385	A ETAP C8	1. KAT	11	934.779
386	A ETAP C8	1. KAT	12	918.781
387	A ETAP C8	1. KAT	13	877.966
388	A ETAP C8	1. KAT	14	1.431.459
389	A ETAP C8	1. KAT	15	1.194.595
390	A ETAP C8	2. KAT	16	712.427
391	A ETAP C8	2. KAT	17	944.866
392	A ETAP C8	2. KAT	18	928.921
393	A ETAP C8	2. KAT	19	887.783
394	A ETAP C8	2. KAT	20	1.447.853
395	A ETAP C8	2. KAT	21	1.460.020
396	A ETAP C8	3. KAT	22	718.958
397	A ETAP C8	3. KAT	23	953.767
398	A ETAP C8	3. KAT	24	937.868
399	A ETAP C8	3. KAT	25	896.445
400	A ETAP C8	3. KAT	26	1.462.318

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ
401	A ETAP C8	ZEMİN KAT	5	1.062.482
402	A ETAP C8	ZEMİN KAT	6	912.220
403	A ETAP C8	ZEMİN KAT	7	871.614
404	A ETAP C8	ZEMİN KAT	8	1.420.851
405	A ETAP C8	ZEMİN KAT	9	1.334.853
406	A ETAP D2	ZEMİN KAT	2	1.563.594
407	B ETAP A8	5. KAT	21	1.132.637
408	A ETAP A1	1. BODRUM	1	1.686.299
409	A ETAP B1	1. KAT	14	631.516
410	A ETAP B1	1. KAT	16	632.346
411	A ETAP B1	2. KAT	23	667.208
412	A ETAP B1	3. KAT	28	1.175.001
413	A ETAP B3	1. KAT	17	652.736
414	A ETAP C1	3. KAT	21	908.175
415	A ETAP C1	ZEMİN KAT	1	752.656
416	A ETAP C18	3. KAT	19	736.629
417	A ETAP C2	2. KAT	13	679.686
418	A ETAP C2	3. KAT	21	931.547
419	A ETAP C6	2. KAT	16	878.871
420	A ETAP C8	1. KAT	10	705.026
421	A ETAP C8	4. KAT	28	725.053
422	A ETAP C9	4. KAT	25	692.903
423	A ETAP E4	3. KAT	11	1.962.276
424	B ETAP A4	4. KAT	19	1.131.787
425	B ETAP A8	6. KAT	28	1.498.490
426	B ETAP C3	2. KAT	16	703.124
427	B ETAP C4	2. KAT	16	709.673
428	B ETAP C4	2. KAT	21	1.467.978
429	B ETAP C4	3. KAT	22	716.222
430	B ETAP C4	3. KAT	23	943.919
431	B ETAP C4	4. KAT	28	722.335
432	B ETAP C5	4. KAT	29	976.049
433	B ETAP F1	2. KAT	7	1.565.851
